

Het handboek van Plan Portfolio

Dag Andersen
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf



Het handboek van Plan Portfolio

Inhoudsopgave

1	Introductie in Plan Portfolio Manager	5
1.1	Inleiding	5
1.1.1		5
1.2	Context-help	5
1.2.1		5
2	Inhoud van portfolio	6
3	Plannen	7
3.1	Beschrijving	7
3.2	Tabel met projecten	7
3.3	Besturen van planning	8
3.4	Planninglog	8
4	Samenvatting	9
5	Voortgang	10
5.1	Beschrijving	10
5.2	Gegevens bewerken	10
5.3	Configuratie	11
6	Prestatie	12
6.1	Beschrijving	12
7	Gebruik van hulpbronnen	13
7.1	Beschrijving	13
8	Gantt-samenvatting	14
8.1	Beschrijving	14
9	Portfolio wordt geconfigureerd	15
9.1	Document	15
10	Dankbetuigingen en licentie	16

Samenvatting

Hoofdstuk 1

Introductie in Plan Portfolio Manager

1.1 Inleiding

1.1.1

WIP: Work In Progress. Do not translate!

De Plan Portfolio Manager laat u meerdere projecten beheren vanuit een enkele toepassing.

Twee voorbeelden van gebruik:

- Meerdere projecten beheren geeft een overzicht over waar de aandacht op te richten.
- Projecten inspecteren en plannen over de gehele organisatie. Assisteren met behandeling van vertragingen, wijziging van prioriteiten of nieuwe projecten invoegen.

Mogelijkheden:

- Plannen of opnieuw plannen van meerdere projecten.
- Hulpbronnen verdelen over projecten.
- Inspecteren van gepland gebruik van hulpbronnen over projecten.
- Voortgangsinformatie inspecteren en bijwerken in tabelvorm evenals in grafieken.
- Gantt-grafieken van projecten inspecteren.

1.2 Context-help

1.2.1

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Veel functies en weergaven hebben hulp en tips die getoond kunnen worden met de functie *Wat is dit*.

U kunt het activeren met het menu-item **Help** → **WatIsDit** of sneltoets **Shift-F1**.

In dialogen is het geactiveerd door op het ? in de dialogentitelbalk te klikken.

Hoofdstuk 2

Inhoud van portfolio

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Deze bewerker schakelt u in om de inhoud van uw portfolio te configureren.

Selecteer **Bewerken** → **Toevoegen (Invoegen)** of druk op **Toevoegen** om projecten aan uw portfolio toe te voegen.

Selecteer **Bewerken** → **Verwijderen (Verwijderen)** of druk op **Verwijderen** om geselecteerde projecten te verwijderen.

Voeg de projecten toe die u beheert en zet **Portfolio** = *Ja*.

Als u hulpbronnen hebt die gebruikt worden door projecten die geen deel van uw portfolio zijn en u wilt gebruik van hulpbronnen opnieuw plannen of inspecteren, dan moet u alle relevante projecten toevoegen en **Portfolio** = *Nee* voor deze projecten zetten.

Opslag

Projectwijzigingen kunnen opgeslagen worden in het originele projectbestand of kunnen ingebed worden in het portfoliobestand. Als u projecten beheert, dan zouden ze normaal opgeslagen moeten zijn in hun originele bestanden. Zet **Opslaan** = *Extern* in dat geval. Als u echter alleen wilt zien welke impact wijzigingen kunnen hebben, dan zou u projecten ingebed willen hebben terwijl u werkt aan verschillende scenarios. Zet **Opslaan** = *Ingebed* in dat geval. De externe url van de projecten wordt bewaard als u later de wijzigingen wilt opslaan in het originele bestand.

Hoofdstuk 3

Plannen

3.1 Beschrijving

WIP: Work In Progress. Do not translate!

De weergave Planning laat u de projecten in uw portfolio plannen. De projecten worden gepland volgens hun prioriteit.

Zet *Besturing* op *Plannen* voor het project of projecten die u wilt plannen. Zet *Besturing* op *Invoegen* om hulpbrontoewijzingen ingevoegd in gelijkschakelen van hulpbronnen te hebben. Zet *Besturing* op *Uitsluiten* als u het project wilt uitsluiten.

TIP

Als uw projecten hulpbronnen delen met projecten die geen onderdeel zijn van uw portfolio, dan moeten deze projecten ingevoegd worden om gelijktrekken van hulpbronnen juist te laten werken. Zie hoofdstuk 2.

De weergave heeft boomstructuursecties:

- Section 3.2.
- Section 3.3.
- Section 3.4.

3.2 Tabel met projecten

Naam	Beschrijving
Naam	Projectnaam
Plannen	Naam van planning
Status	Planningstatus

Besturing	Besturing van plannen kan de volgende waarden hebben: • <i>Plannen</i>: het project zal gepland worden. • <i>Invoegen</i>: boekingen voor hulpbronnen zullen ingevoegd worden in hulpbron gelijkschakelen. • <i>Uitsluiten</i>: Het project zal niet ingevoegd worden.
Prioriteit	Projectprioriteit. Een hoger getal betekent hogere prioriteit.
Beoogd begin	De vroegste begintijd van het project
Beoogd einde	De laatste eindtijd van het project
Beschrijving	Projectbeschrijving

3.3 Besturen van planning

WIP: Work In Progress. Do not translate!

3.4 Planninglog

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Hoofdstuk 4

Samenvatting

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Deze weergave vat prestatiegegevens voor alle projecten in uw portfolio samen.

Naam	Beschrijving
Naam	Projectnaam
Plannen	Naam van planning
SPI-kosten	Prestatie-index van planning (gebaseerd op kosten)
CPI-kosten	Prestatie-index van planning (gebaseerd op kosten)
SPI-inspanning	Prestatie-index van planning (gebaseerd op inspanning)
CPI-inspanning	Prestatie-index van planning (gebaseerd op inspanning)

SPI geeft aan of de voortgang volgens planning is (1), achter planning is (minder dan 1) of voorloopt op de planning (groter dan 1). CPI geeft aan hoeveel het heeft gekost om de actuele voortgang te verkrijgen. Een waarde van 1 betekent zoals gepland, minder dan 1 betekent dat het meer heeft gekost dan het zou moeten hebben gekost en een waarde groter dan 1 betekent dat de voortgang is verkregen met minder gebruik van hulpbronnen dan gepland.

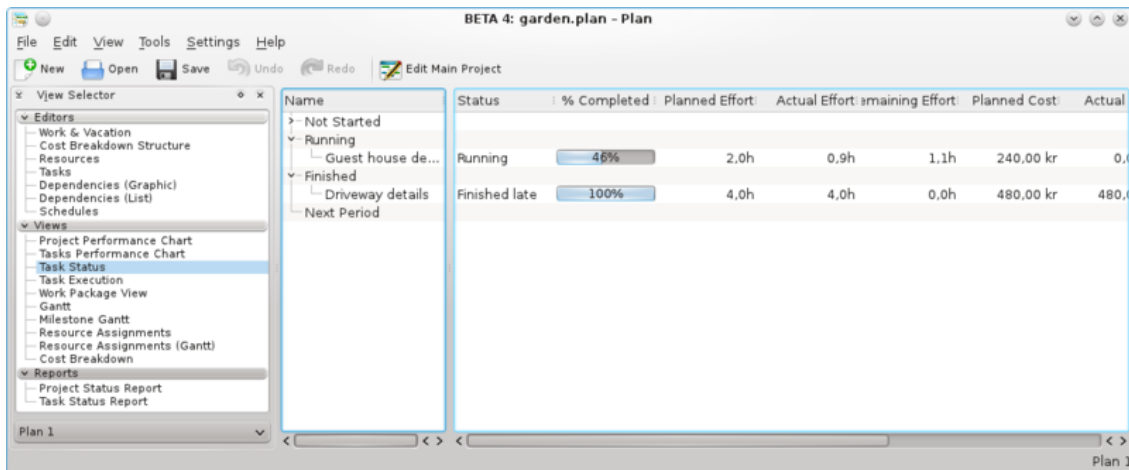
Hoofdstuk 5

Voortgang

5.1 Beschrijving

WIP: Work In Progress. Do not translate!

De voortgangswaergave biedt een lijst met de projecten in uw portfolio aan de linkerkant en toont voortgangsinformatie voor het geselecteerde project aan de rechterkant.




De taken zijn opgedeeld in groepen afhankelijk van de status van de taak:

Niet gestart	Taken die nu gestart zouden moeten zijn.
Actief	Taken die zijn gestart, maar nog niet zijn voltooid.
Beëindigd	Taken die in deze periode zijn voltooid
Volgende periode	Taken die zijn gepland om in de volgende periode te starten.

5.2 Gegevens bewerken

Het handboek van Plan Portfolio


Voortgangsinformatie kan in-line bewerkt worden of door de dialoog takenvoortgang.	
---	--

De volgende kolommen worden standaard getoond:

Kolom	Beschrijving
Naam	De naam van de taak.
Status	Taakstatus
% voltooid	Taakvoltooiing
Geplande inspanning	De hoeveelheid gepland werk om gebruikt te worden aan het eind van de huidige periode.
Werkelijke inspanning	De hoeveelheid gedaan werk.
Resterende inspanning	De resterende inspanning om de taak te voltooien.
Geplande kosten	De geplande kosten aan het eind van de huidige periode.
Werkelijke kosten	De echt gemaakte kosten.
Werkelijke start	De werkelijke starttijd van de taak.
Werkelijk einde	De werkelijke eindtijd van de taak.

5.3 Configuratie

Met het contextmenu kan de weergave geconfigureerd worden om de boomstructuur in of uit te vouwen of het kan geconfigureerd worden met de configuratiedialoog.

De configuratiedialoog biedt u het aanpassen van de hoeveelheid informatie die de weergave toont om in uw behoefte te voorzien.	
--	--

Hoofdstuk 6

Prestatie

6.1 Beschrijving

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Toont grafieken van de prestatie van het geselecteerde project.

Hoofdstuk 7

Gebruik van hulpbronnen

7.1 Beschrijving

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Toont een grafiek van de geplande load voor geselecteerde hulpbron met kleurcode per taak.

Hoofdstuk 8

Gantt-samenvatting

8.1 Beschrijving

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Toont een gantt-grafiek van alle projecten in uw portfolio.

Een gantt-weergave voor een project kan getoond worden door te selecteren **Context-menu->Project openen**.

Hoofdstuk 9

Portfolio wordt geconfigureerd

9.1 Document

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Hoofdstuk 10

Dankbetuigingen en licentie

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op <http://www.kde.nl/bugs>.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf freekdekruijf@kde.nl.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de [GNU vrije-documentatie-licentie](#).
